체인블록의 로드체인이 파단되어 인양하던 압력용기에 깔림

공 사 명	○○ 발효관 및 자동화 연계 동기화 공사	발생일시	2019.03.04.(월) 11:20경
재해형태	깔림	재해정도	사망 1명
소 재 지	경기 김포시 월곶면 개곡리	공사규모	발효관 및 자동화 연계 외 부속설비 일체
재해개요	2019. 3. 4.(월) 11:20경 경기도 김포시 월곶면 개곡리 소재 ○○이엔지㈜ ○○ 발효관 및 자동화 연계 동기화 공사 현장에서 체인블록을 사용하여 바닥에 눕혀진 압력용기(약1.7ton)를 들어 세우던 중 체인블록의 로드체인이 파단되면서, 주변에서 작업 중이던 재해자가 전도되는 압력용기에 맞은 후 깔려 사망한 재해임.		

재 해 상 황 도

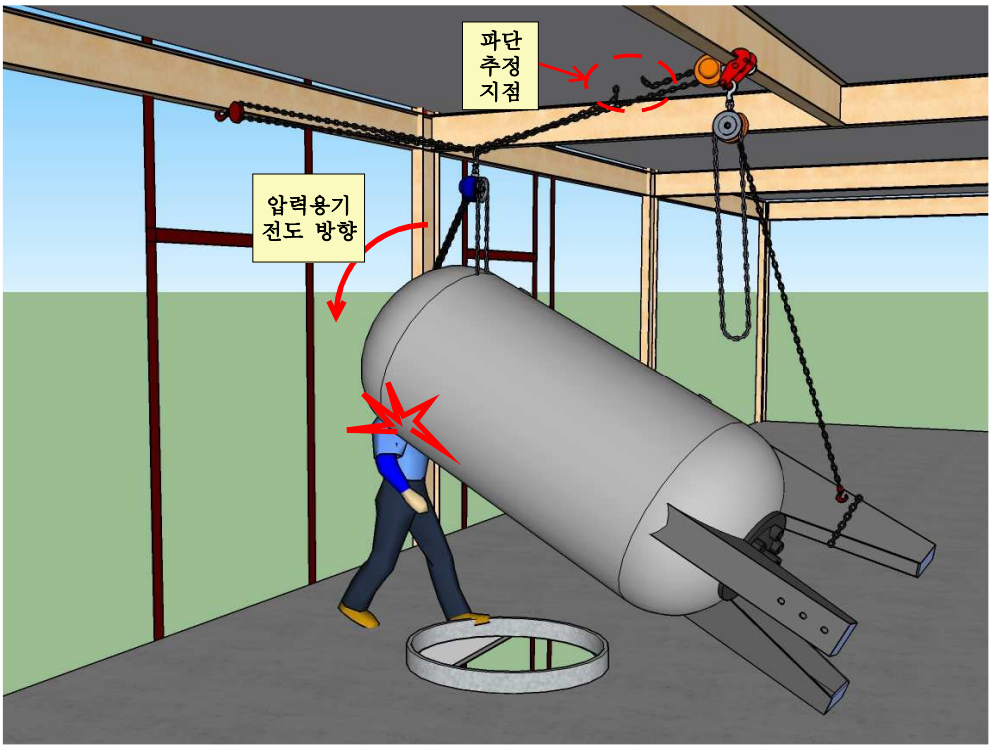

안 전 대 책

□ 달기구의 정격하중 준수

❍ 체인블록 등 달기구의 안전한 사용 방법에 따라 정격하중을 초과하여 사용하지 않도록 하여야 함.

□ 중량물 취급 작업계획서 작성 · 준수

❍ 줄걸이 체결 및 중량물 지지방법, 체인 등 손상여부 확인 및 교체방법 등 중량물 취급작업 시 낙하, 전도의 위험을 예방할 수 있는 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성 후 그 계획에 따라 작업을 하여야 함.

○ 참고자료(사진 2장)

사진1. 전도된 압력용기 상부 체인블록 체결 상태

사진2. 체인블록이 설치되어 있던 천장부(철골보)
